

中村川広域河川改修事業

1. 事業概要

- 事業名： 広域河川改修事業
- 事業箇所： 中村川(鱒ヶ沢町)
- 事業期間： 平成19年度～平成38年度(予定) (20年)
- 事業費： 5, 100百万円
- 事業評価： 平成28年度 再評価(着手後10年)

2. 事業の目的

中村川の下流域には、JR鱒ヶ沢駅、国道101号、鱒ヶ沢漁港等が集中し、洪水被害が発生した場合、地域の社会・経済に深刻な影響を及ぼすおそれがある。過去には昭和33年8月洪水、昭和50年8月洪水において大きな被害を被っている。さらに、近年も平成14年、平成17年、平成21年、平成25年、平成26年と避難判断水位を超え、平成16年9月、平成27年4月には氾濫危険水位を超える出水となるなど、水害防除が喫緊の課題となっている。

このことから、河川改修事業により治水安全度を向上させ、鱒ヶ沢町の社会・経済の中心地を洪水被害から防御するものである。

3. 工事内容等

- 主な構造物： 河川改修延長 L=1,400m


築堤	L=2,800m	}	(左右岸)
掘削	L=1,400m		
護岸	L=2,800m		
橋梁	N=3基		
- 進捗状況： 下流約0.2km～0.4km付近の橋梁2橋の架替えが完了し、事業計画どおり進んでいる。
 今後は河口～下流0.4kmまでの区間において治水安全度の向上を図るため河川改修(河道拡幅)を進める。

[全体計画図]

(1) 事業実施箇所位置図




(2) 全体計画平面図

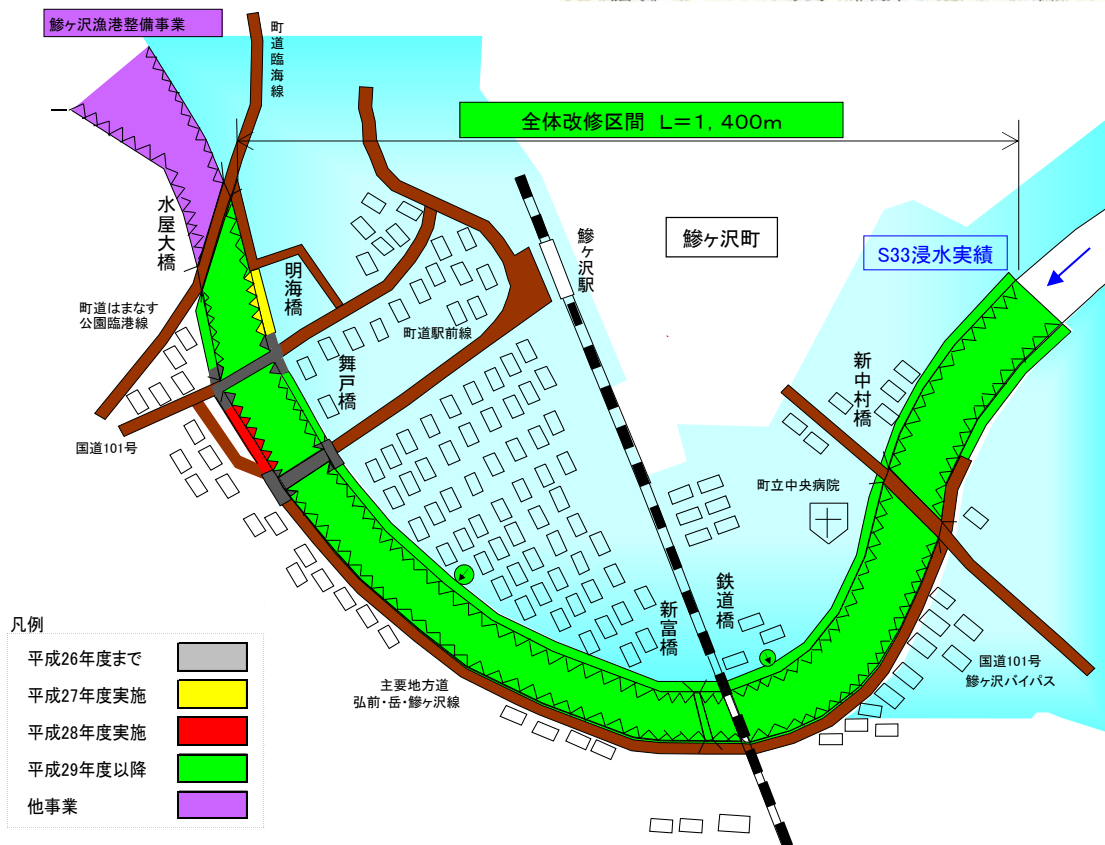

[構造図]

○標準横断面図

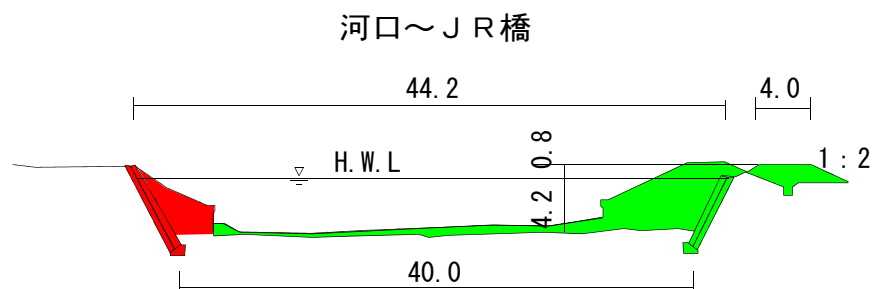



現地写真

①明海橋:改修前



②明海橋:改修後



現地写真

①舞戸橋:改修前



②舞戸橋:改修後



出水時の状況

昭和33年8月10日



平成25年9月16日

