岩木川水系　目屋ダムの効果（平成27年4月3日低気圧・融雪）【速報】　青森県

○平成27年4月3日低気圧の影響により、**累計雨量が85mmを記録するとともに、融雪**も伴ってダムへの最大流入量は計画流入量500m³/sを上回る　**約670m³/sを記録した。**

○目屋ダムでは、今回の洪水調節により**最大480m³/sを調節し、**ダム下流の上岩木橋地点（弘前市大字下湯口付近）では、**水位を約0．8m低減させる効果**があったものと推測。

○なお、直下流では目屋ダムの機能を確保しながら**「津軽ダム」**（東北地方整備局）**を建設中**であり、完成後には**さらなる治水効果が期待**される。

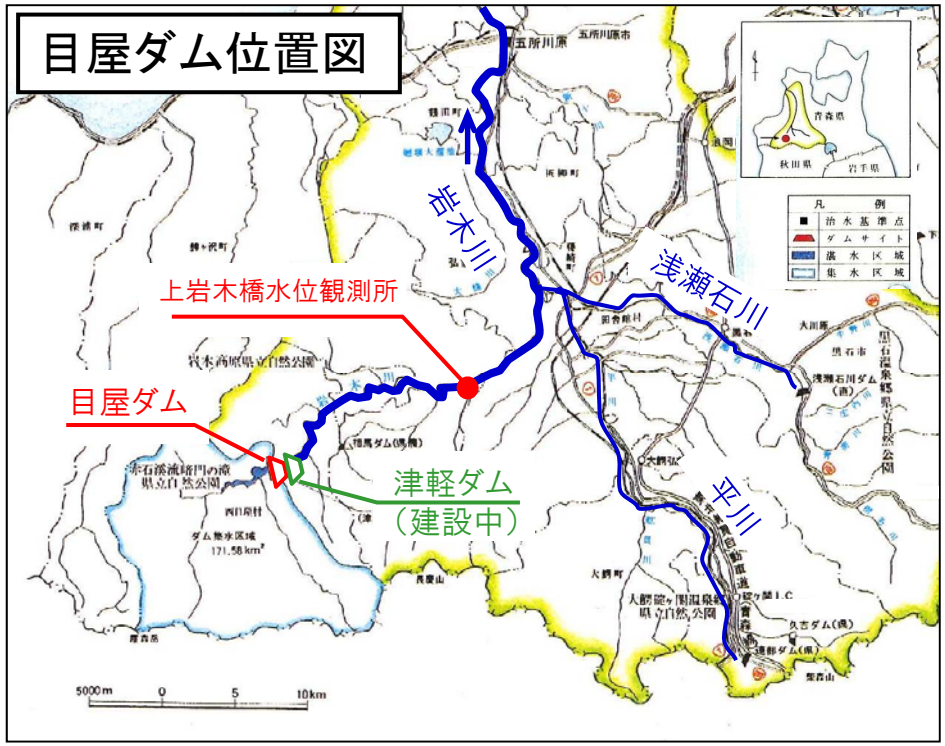

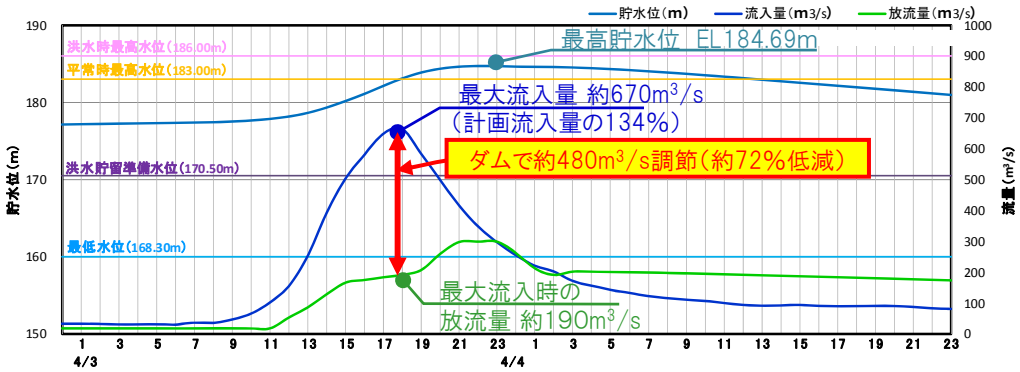



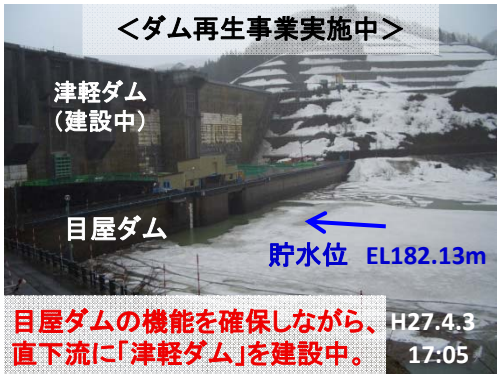
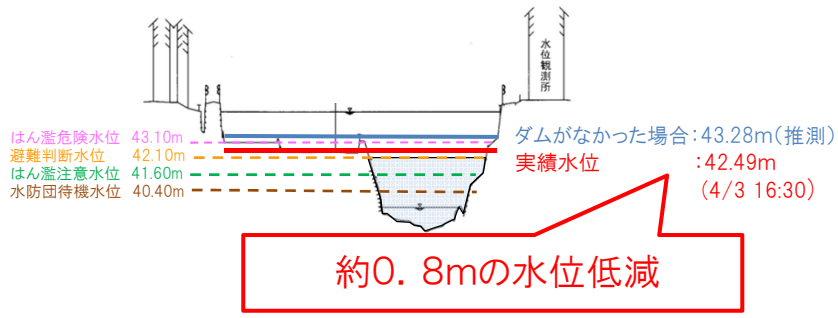
上岩木橋地点の水位低減効果
