岩木川水系　遠部ダムの効果（令和5年8月7日の大雨）

青森県

○遠部ダム流域では、令和5年8月7日の大雨の影響によりダム地点の累計雨量76mmを観測
○ダムへの最大流入量は33.8m³/sを記録。ダムでは洪水調節により、最大17.4m³／s（51.4%）をダムに貯留
○その結果、大鰐地点で、最大約0.33mの水位を低減させる効果があったものと推測

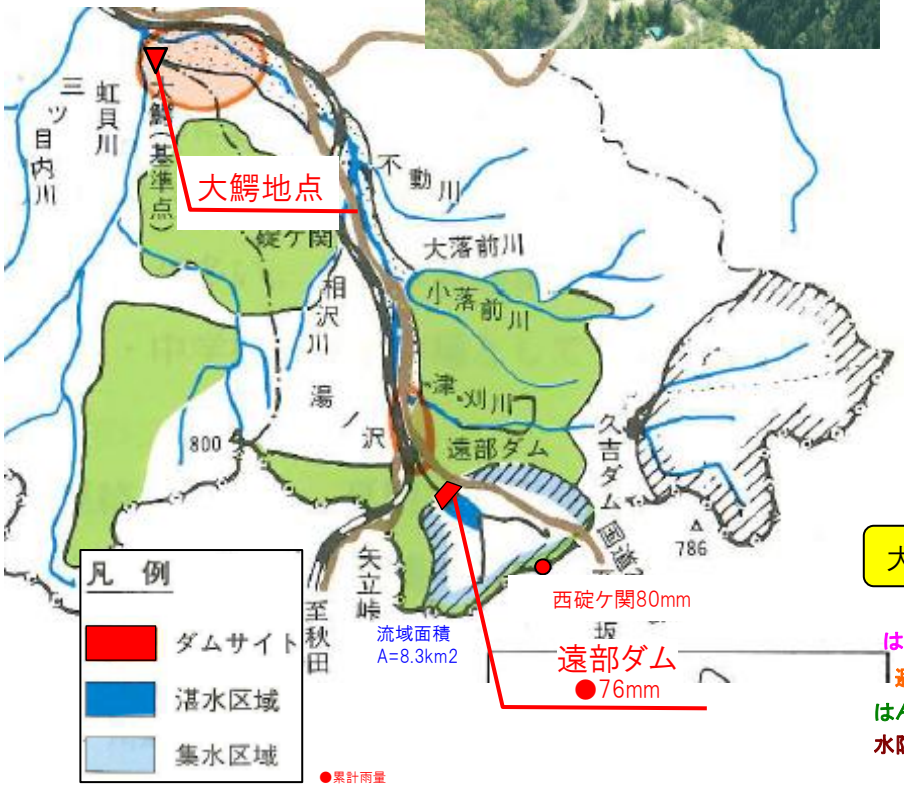



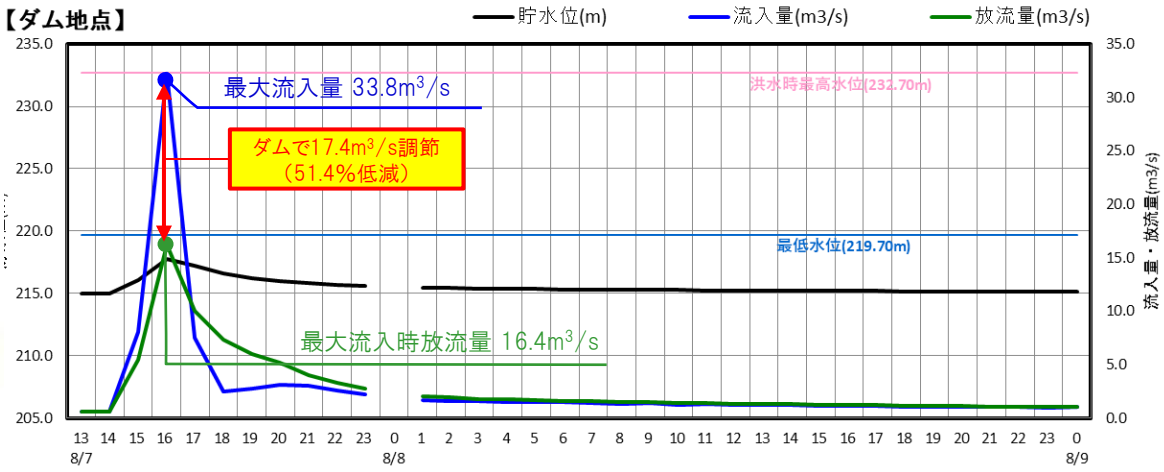

大鰐地点の水位低減効果
